


# INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

ENERO-JUNIO



24



**Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo**  
Pável Isa Contreras

**Viceministro de Planificación**  
Luis Madera

**Director General de Inversión Pública**  
Martín Francos

**Encargado de Formulación y Programación de la Inversión Pública**  
Víctor Hughes

**Encargado de Administración de la Información de la Inversión Pública**  
Eddy Gomera

**Encargada de Proyectos de Alianzas Público - Privadas**  
Yanna Dishmey

**Encargada de la División de Seguimiento de la Inversión Pública**  
Solendy Capellán

**Coordinación Técnica**  
Vickeisy Mercado

**Equipo de trabajo:**

|                  |                 |                 |                  |                   |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| José Bencosme    | Yuderca Jiménez | Víctor Martínez | Keny Montero     | Emma Rodríguez    |
| José Cabreja     | Glenn Holguín   | Ana F. Mejía    | Nataly Nova      | Juan Rosario      |
| Carlos Cedeño    | Liana Lama      | Ana Méndez      | Eury Ortiz       | Amín Santana      |
| Máximo Contreras | Diego Lassis    | Pilar Melgarejo | Alberto Pichardo | Raúl Santos       |
| Julio Fanith     | Freddy Martínez | Luisa Miolán    | Madeleine Rivera | Estefanía Santana |

## Tabla de contenido

|  |    |
|--|----|
| 1. Contexto macroeconómico .....   | 2  |
| 2. Proyectos de inversión pública aprobados entre enero-junio 2024 .....                     | 3  |
| 3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP).....             | 6  |
| 4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) .....             | 8  |
| 4.1. Análisis por institución ejecutora .....  | 8  |
| 4.2. Análisis según clasificación funcional .....  | 9  |
| 4.3. Análisis por zona geográfica .....  | 10 |
| 4.4. Análisis según fuentes de financiamiento .....  | 11 |
| 4.5. Análisis según tipología del proyecto .....   | 12 |
| 4.6. Análisis según sector institucional .....   | 13 |
| 5. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo | 14 |
| 6. Proyectos con mayor ejecución en el primer semestre 2024.....                             | 15 |
| 7. Anexos .....  | 18 |

## Índice de gráficos

|  |    |
|--|----|
| Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana, enero-junio 2018-2024 (Variación interanual).....                          | 2  |
| Gráfico 2. Inflación e inflación subyacente, enero 2019- junio 2024 (variación interanual) .....   | 2  |
| Gráfico 3. Gasto de capital como porcentaje de PIB, enero-junio 2019-2024 (Millones RD\$).....   | 2  |
| Gráfico 4. Cantidad de proyectos aprobados y costo total, enero-junio 2024 (Millones RD\$).....  | 3  |
| Gráfico 5. Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2024 (Millones RD\$) .....                                      | 3  |
| Gráfico 6. Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2024 (Millones RD\$).....                                    | 4  |
| Gráfico 7. Instituciones con mayor número de aprobación de proyectos aprobados, 2024 .....   | 4  |
| Gráfico 8. Ejecución financiera de PIP, enero-junio 2018-2024 (Millones RD\$).....   | 6  |
| Gráfico 9. Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2024 (Millones RD\$).....   | 6  |
| Gráfico 10. PIP programado anual vs. Ejecutado entre enero-junio, 2018-2024 (Millones RD\$) .....  | 7  |
| Gráfico 11. PIP ejecutados entre enero-junio como porcentaje del PIB 2018-2024 .....   | 7  |
| Gráfico 12. PIP programado anual vs. ejecutado por institución ejecutora, enero-junio 2024 (Millones RD\$).....                                  | 8  |
| Gráfico 13. PIP ejecutados y participación porcentual en la ejecución total por función, enero-junio 2024 (Millones RD\$) .....                  | 9  |
| Gráfico 14. PIP ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2024.....   | 10 |
| Gráfico 15. PIP per cápita ejecutados a nivel provincial, enero-junio 2024 .....   | 10 |
| Gráfico 16. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento .....   | 11 |
| Gráfico 17. Instituciones financiadoras del crédito externo (Millones RD\$) .....  | 11 |
| Gráfico 18. PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero-junio 2024 .....   | 12 |
| Gráfico 19. Proyectos de Inversión Pública programado anual vs. ejecutado por tipología y estado, enero-junio 2024 (Millones RD\$) .....         | 12 |
| Gráfico 20. Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, enero-junio 2024 .....                               | 13 |
| Gráfico 21. PIP ejecutado por Subsector Institucional, enero-junio 2024 (Millones RD\$) .....  | 13 |
| Gráfico 22. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2024 ..... | 14 |
| Gráfico 23. PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2024 (Millones RD\$) .....                                    | 15 |

## Índice de tablas

|   |    |
|---|----|
| Tabla 1. Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución entre enero-junio 2024 (Millones de RD\$) ..... | 17 |
|---|----|

## Lista de siglas

- **BCRD:** Banco Central de la República Dominicana.
- **END:** Estrategia Nacional de Desarrollo.
- **ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- **PNPSP:** Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
- **PIP:** Proyecto de inversión pública.

## Glosario

- **Clasificación funcional del gasto:** agrupa los gastos que realizan las instituciones públicas de acuerdo con las funciones a las que contribuyen los proyectos de inversión pública.
- **Fuente de financiamiento:** hace referencia a la fuente de donde provienen los ingresos para ejecutar los proyectos de inversión pública. Si los ingresos son del grupo interno (Estado dominicano), la fuente es *general*; si se derivan de préstamos y donaciones externas, la fuente es el *crédito externo y donaciones*, respectivamente.
- **Gasto de capital:** son los gastos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de activos de capital fijo. Los gastos de capital incluyen los pagos con contraprestación, como son: inmuebles, maquinarias, activos intangibles, etc. y pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital.
- **Institución ejecutora:** es la encargada de la realización del PIP en términos administrativos, técnicos y financiero, e incluye entre otros la formulación, contratación, presupuestación y pagos de los proyectos bajo su cargo.
- **Inversión programada:** Se refiere a los montos que las instituciones ejecutoras proyectan devengar durante el período de programación para llevar a cabo los PIP.
- **Nivel de gobierno:** se fundamenta en la estructura organizativa del sector público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan las apropiaciones presupuestarias conforme a su naturaleza, misiones, régimen de derechos y obligaciones (estatus jurídico).
- **Proyecto inversión pública aprobado:** es un proyecto de inversión que cuenta con el informe favorable del SNIP, porque su estudio de preinversión demuestra su viabilidad técnica, económica, social y ambiental.
- **Proyecto de Inversión Pública (PIP):** es el conjunto de actividades que

requieren del uso de recursos del presupuesto público, con un inicio y fin claramente definido y con una localización geográfica específica, cuyo objetivo es la generación de capacidad expresada en capital fijo, capital humano o creación de conocimiento.

- **Situación presupuestaria:** el SNIP clasifica los proyectos de inversión de acuerdo con su situación presupuestaria, en nuevos y de arrastre:
  - *Nuevo:* cuando ha sido declarado admisible por el MEPyD y registrado en el SNIP y no tiene monto devengado en ninguno de sus componentes.
  - *Arrastre:* cuando su ejecución ha sido iniciada en años anteriores, es decir, cuando tiene montos devengados en alguno de sus componentes en años presupuestarios anteriores al año

presupuestario para el que se está solicitando recursos financieros.

- **Tipología de proyectos:** se reconocen tres tipologías:
  - *Capital fijo:* creación, incremento, rehabilitación y mejora de la capacidad instalada para la producción de bienes o la prestación de servicios.
  - *Capital humano:* Implementación, mantenimiento y recuperación de la eficiencia y productividad del capital humano.
  - *Creación de conocimiento:* está vinculado a investigaciones, desarrollos tecnológicos, catastros, diagnósticos, inventarios, censos y cualquier otro tipo de acción orientada a la creación de conocimiento y que, por tanto, genere valor agregado en el ambiente que se desarrolle.

## Fuentes de información

Las informaciones de este informe provienen del Sistema Nacional de Inversión Pública, según lo reportado por las instituciones ejecutoras, respecto del avance físico y financiero de cada uno de los proyectos incluidos en el plan de inversión pública 2024.

Para tales fines, las instituciones ejecutoras registraron hasta el 31 de junio de 2024 la ejecución física y financiera de cada proyecto de inversión pública, a través del sistema de información del SNIP. Dichos registros fueron validados posteriormente por los analistas de la DGIP luego de contrastar con otras fuentes (como SIGEF y UEPEX), tras lo cual se procede a elaborar el presente informe.

## Introducción

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), como órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), tiene dentro de sus responsabilidades verificar que los proyectos de inversión pública (PIP) estén alineados a las prioridades de desarrollo pautadas en los instrumentos del sistema, entre estos, se destaca la de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual define la visión de desarrollo del país a largo plazo, y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), el cual se actualiza anualmente y contiene la producción pública prioritaria en el mediano plazo. Adicionalmente, la inversión pública se debe encaminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la cual la República Dominicana es signataria.

Un adecuado seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión cumple con la cultura de rendición de cuentas y provisión de información que permite identificar tendencias en la asignación de fondos y la toma de decisiones en la gestión de recursos públicos. En este tenor, el Decreto 231-07, que establece el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), le asigna a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) la función de *"Analizar y evaluar la ejecución de la inversión pública y preparar el informe semestral al Congreso, sobre el estado de ejecución de los proyectos de inversión del sector público, así como otros informes que le sean requeridos"* (Literal n, Artículo 21). A su vez, el Decreto 493-07 de Reglamento para la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, indica que *"... la DGIP emitirá su informe sobre la ejecución de los proyectos de inversión, cualquiera sea su tipología, donde evaluará los resultados de la programación de inversiones, el grado de cumplimiento de la programación física y financiera, y verificará, a través de una muestra con visitas de campo, que los proyectos en ejecución visitados no hayan sido modificados en su naturaleza durante su contratación o desarrollo"*.


En cumplimiento con las referidas disposiciones, se presenta este informe semestral, el cual tiene como propósito analizar el estado de ejecución de los proyectos de inversión pública (PIP) durante el primer semestre 2024. Asimismo, mediante la desagregación de los montos ejecutados en diferentes categorías, permite identificar en qué medida el Estado, en su acción de proveer bienes y servicios públicos a través de proyectos de inversión pública, está contribuyendo al logro de los objetivos planteados por la nación en el largo plazo.

En el primer capítulo se presenta el contexto macroeconómico en el cual se desempeñaron los proyectos de inversión pública entre enero-junio 2024, luego de esto se presenta una mirada a lo que sucedió en el semestre en términos de admisiones en el SNIP. El tercer capítulo muestra el panorama histórico de ejecución de los PIP desde 2018 hasta junio 2024 y se detalla la ejecución según su tipología, estado de proyectos, fuente de financiamiento, subsector institucional, clasificación funcional y por institución ejecutora. Seguido se analiza la contribución de los PIP al desarrollo nacional mediante su vinculación a la END. Por último, se especifican los proyectos de inversión pública de mayor ejecución durante el primer semestre 2024.

# 1. Contexto macroeconómico

La República Dominicana ha experimentado un notable crecimiento económico en los últimos años, consolidándose como una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe. Entre 2008 y 2023, el país registró un crecimiento promedio anual del PIB del 4.6%, impulsado por sectores como la Construcción, Servicios, Manufactura de zonas francas y Agropecuario.

**Gráfico 1.** Producto Interno Bruto (PIB) real de República Dominicana, enero-junio 2018-2024 (Variación interanual)

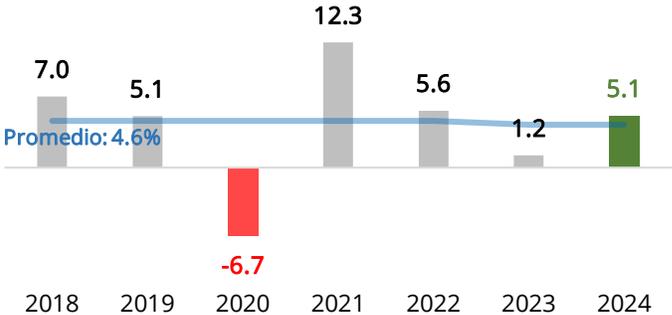


**Fuente:** Elaboración propia con datos del Banco Central de República Dominicana (BCRD). (\*) Cifras preliminares.

Al cierre de junio de 2024, el crecimiento económico alcanzó un 7.9%, por encima del promedio histórico, reflejando la capacidad de adaptación y resiliencia de la economía dominicana.

El crecimiento del PIB en el primer semestre de 2024 fue liderado por sectores estratégicos, como la Manufactura en zonas francas y la Construcción, con crecimientos de 5.9% y 4.9%, respectivamente. Además, el sector Servicios, particularmente los Hoteles, bares y restaurantes, junto con los Servicios financieros, mostraron un crecimiento de 8.7% y 7.9%, respectivamente.

En cuanto al contexto inflacionario, el país ha logrado mantener la estabilidad de precios, con una inflación interanual de 3.5% en junio 2024, manteniéndose dentro del rango meta de 4% ±1%, como resultado de las políticas monetarias y fiscales implementadas durante el último año. También, se observa cómo la inflación subyacente, que mide la variación de precios excluyendo los bienes y servicios más volátiles, ha mantenido una tendencia a la baja, ubicándose en 4.0%.


**Gráfico 2.** Inflación e inflación subyacente, enero 2019- junio 2024 (variación interanual)

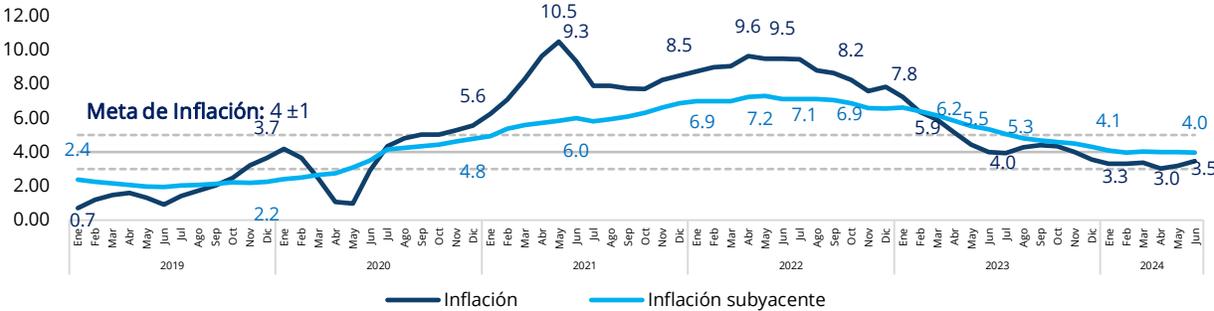

**Fuente:** Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La política fiscal del gobierno ha estado marcada por un notable incremento en el gasto de capital, alcanzando los RD\$74,385 millones durante enero-junio 2024, un incremento de 18.4% respecto al mismo periodo del año anterior, representando un 2.1% del PIB, el mayor nivel en los últimos cinco años.

**Gráfico 3.** Gasto de capital como porcentaje de PIB, enero-junio 2019-2024  
(Millones RD\$)

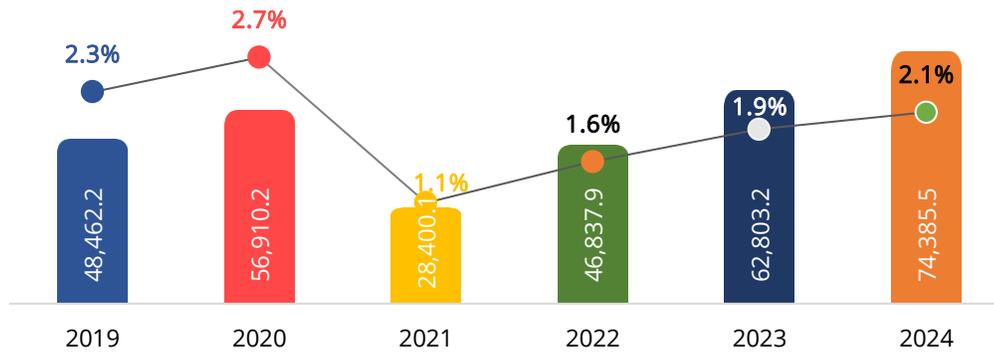

**Fuente:** Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana y la Dirección General de Presupuesto.

## 2. Proyectos de inversión pública aprobados entre enero-junio 2024

Durante el primer semestre del 2024, se aprobaron 443 proyectos de inversión pública, número que supera el promedio histórico registrado desde la entrada en funcionamiento del actual Sistema Nacional de Inversión Pública de 311 proyectos. El costo total de los proyectos aprobados fue de RD\$239,392 millones, el mayor monto aprobado en los últimos cinco años.


**Gráfico 4.** Cantidad de proyectos aprobados y costo total, enero-junio 2024 (Millones RD\$)



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

El 39.2% de los proyectos aprobados entre enero-junio del 2024 corresponde a Educación (158 proyectos), destinados en su mayoría a proyectos para la construcción de aulas de nivel inicial.


**Gráfico 5.** Cantidad de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2024 (Millones RD\$)

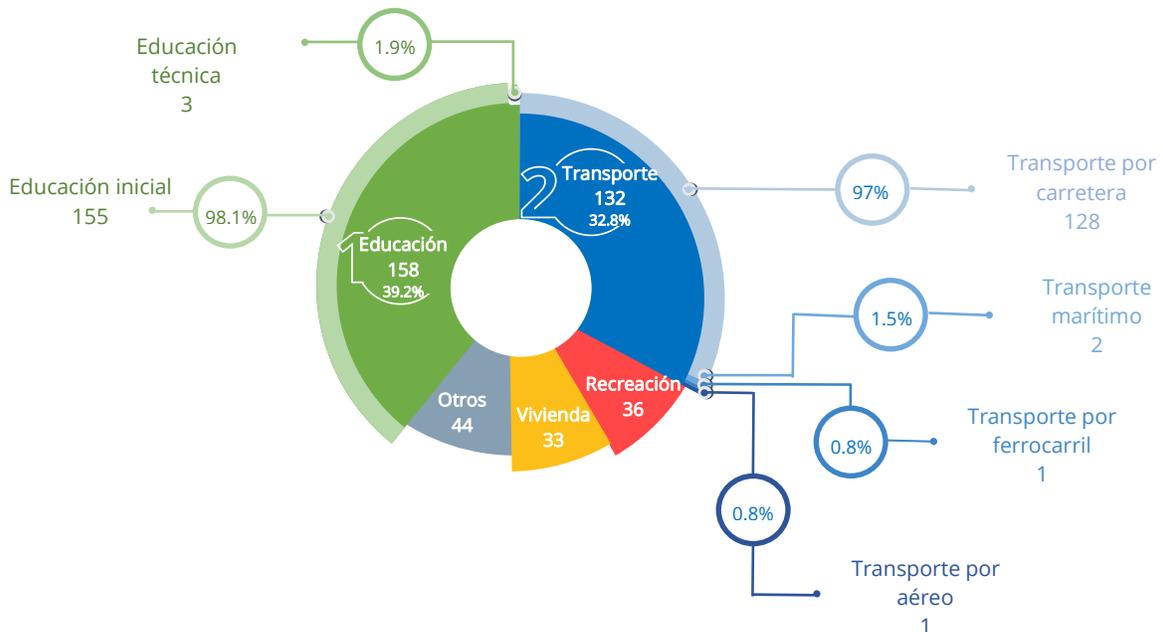

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Los proyectos con mayor costo total aprobado corresponden a la función Transporte con RD\$105,110.4 millones (43.9% del total aprobado), de los cuales RD\$69,864.1 millones (29.2%) serán destinados a Transporte por ferrocarril. En segundo lugar, se encuentra Energía y combustible con un monto aprobado por RD\$88,501.9 millones (37% del total aprobado), específicamente RD\$88,404 millones a Energía eléctrica (36.9%).

**Gráfico 6.** Costo total de proyectos aprobados por función y subfunción, enero-junio 2024 (Millones RD\$)

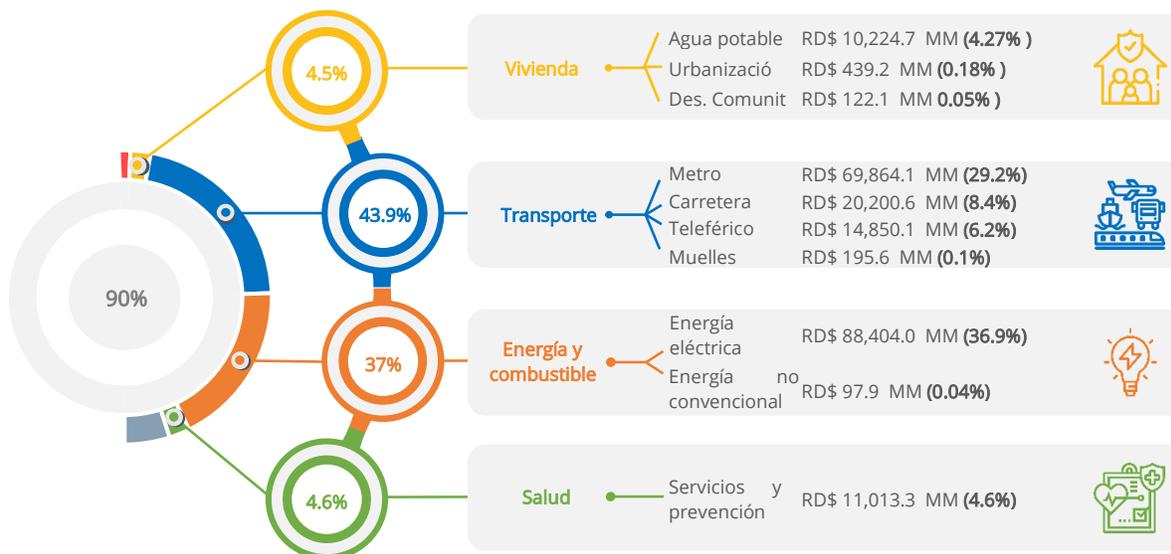

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

El Ministerio de la Presidencia (MINPRE) representa la institución con el mayor costo de inversión aprobado acumulado en enero – junio 2024, seguido de las Empresas distribuidoras de electricidad Este, Norte y Sur, por un monto de RD\$42,893.4, RD\$24,268.1 y RD\$21,242.5 millones, respectivamente. El 82.5% del monto total aprobado en el MINPRE está destinado a la construcción del Tren Metropolitano de Santo Domingo, y resto para la construcción de la Línea III del Teleférico del km 9 hasta Bajos de Haina, en la provincia Santo Domingo.

La institución con mayor número de proyectos aprobados fue el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que registró 167 proyectos (41.4% del total aprobado), seguido del Ministerio de Educación (MINERD), con 155 proyectos (38.5% del total). El 52.4% del total aprobado en el MOPC está destinado a la construcción y reconstrucción de carreteras, mientras que la totalidad de los proyectos aprobados en el MINERD es para la ampliación de planteles educativos para nivel inicial.

**Gráfico 7.** Cantidad de proyectos y costos aprobados por institución ejecutora, enero-junio 2024  
(Millones RD\$)




**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

### 3. Panorama general de la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP)

La ejecución financiera de los PIP en el primer semestre 2024 alcanzó los RD\$44,867.0 millones, lo que representa un incremento de 4.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este sentido, la ejecución entre enero-junio 2024 ha sido la mayor en los últimos siete años, superando el promedio histórico de RD\$31,652.2 millones registrado entre 2017 a 2023.

**Gráfico 8.** Ejecución financiera de PIP, enero-junio 2018-2024 (Millones RD\$)

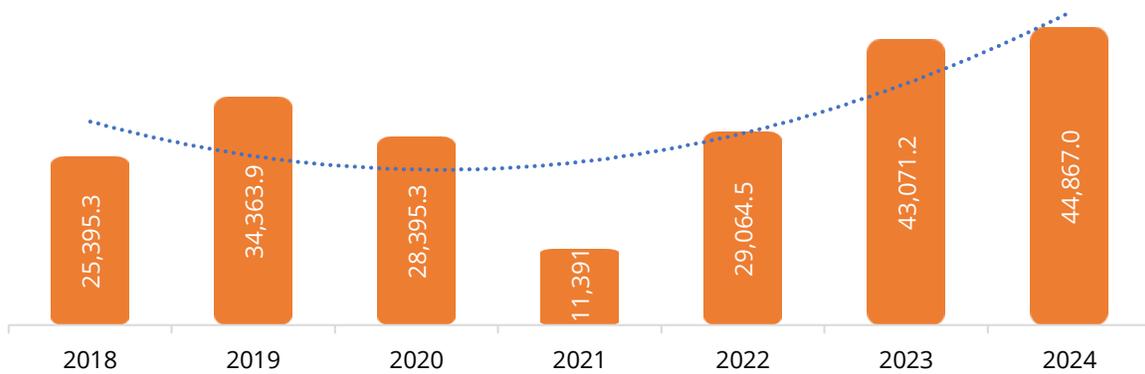

**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Para el primer trimestre 2024, la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública fue de RD\$14,526.9 millones, incrementando en el segundo semestre a RD\$30,340.1 millones, para un total anual acumulado de RD\$44,867.0 millones.


**Gráfico 9.** Evolución trimestral de la ejecución de PIP, 2019-2024 (Millones RD\$)



**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Analizando la ejecución respecto a la programación inicial para el año, se observa que el porcentaje de ejecución para el primer semestre 2024 fue de 45.2%. Desde 2022 la ejecución ha mostrado un buen desempeño, en comparación con los años previos que en promedio no superaba el 30% respecto a lo programado del año.


**Gráfico 10.** PIP programado anual vs. Ejecutado entre enero-junio, 2018-2024 (Millones RD\$)

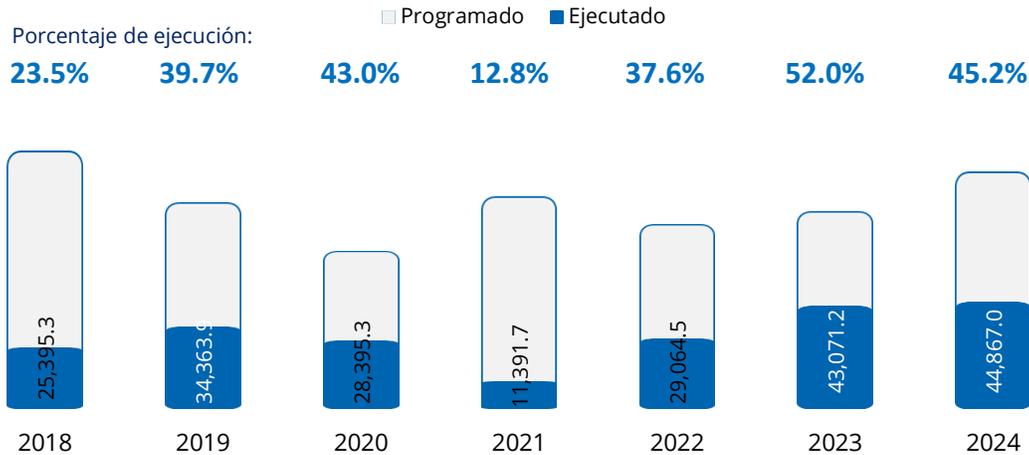

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), MEPyD.

Al analizar como porcentaje del PIB, para el primer semestre 2024, las inversiones ejecutadas se ubicaron en 1.3% como proporción del PIB, sin mostrar ninguna variación con respecto al mismo periodo del 2023.

**Gráfico 11.** PIP ejecutados entre enero-junio como porcentaje del PIB 2018-2024

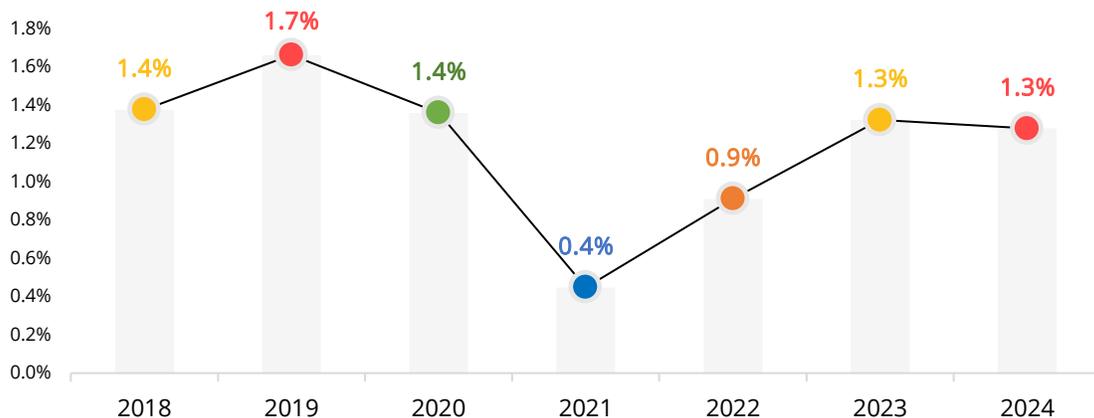

Nota: Para el PIB enero-junio 2024 se hizo una proyección a partir de datos del Banco Central.

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública y Banco Central de la República Dominicana.

## 4. Composición de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública (PIP)


A continuación, se detalla la ejecución acumulada del primer semestre 2024 según distintas clasificaciones de los proyectos.

### 4.1. Análisis por institución ejecutora

La distribución de la ejecución total de proyectos entre las instituciones ejecutoras es encabezada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con un monto de RD\$18,535.6 millones (41.3% de la ejecución total), seguido del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) con RD\$ 7,284.1 millones (16.2% del total ejecutado) y por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) con RD\$3,284.4 millones, equivalente a un 7.3% de la ejecución total. Estas tres instituciones ocupan el 65% del total de la ejecución del primer semestre 2024.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) fue la institución con mayor ejecución respecto a su programación del año, con un monto ejecutado de RD\$3,262.3 millones o 85.8% de su programación para el año, seguido por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), con 74.8% y la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) con una ejecución de RD\$726.1 millones, un 56.4% del monto programado para el año por dicha institución

**Gráfico 12.** PIP programado anual vs. ejecutado por institución ejecutora, enero-junio 2024 (Millones RD\$)

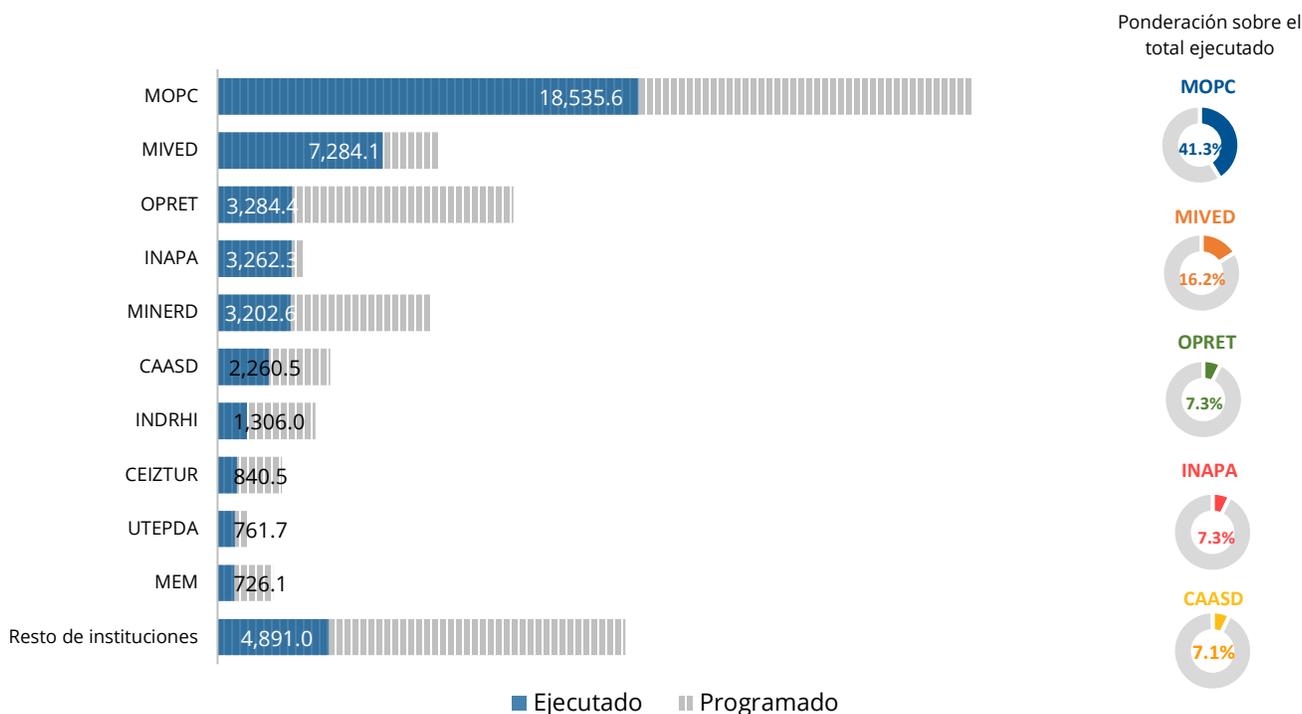


Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 4.2. Análisis según clasificación funcional<sup>1</sup>

La mayor cantidad de recursos fueron destinados a la función Transporte, por un monto de RD\$20,663.5 millones, o 46.1% de la ejecución total; seguida de Vivienda y servicios comunitarios, con una ejecución de RD\$6,545.7 millones o 14.6% del total ejecutado. Estas dos funciones en conjunto representaron el 60.6% del monto total ejecutado en el primer semestre 2024.

La tercera función con mayor inversión fue Educación, con un monto ejecutado de RD\$4,391.7 millones o 9.8% del total. Otros sectores con inversiones significativas fueron Salud y Protección del aire, agua y suelo, con montos respectivos de RD\$3,494.3 millones y RD\$2,252.8 millones.

**Gráfico 13.** PIP ejecutados y participación porcentual en la ejecución total por función, enero-junio 2024 (Millones RD\$)

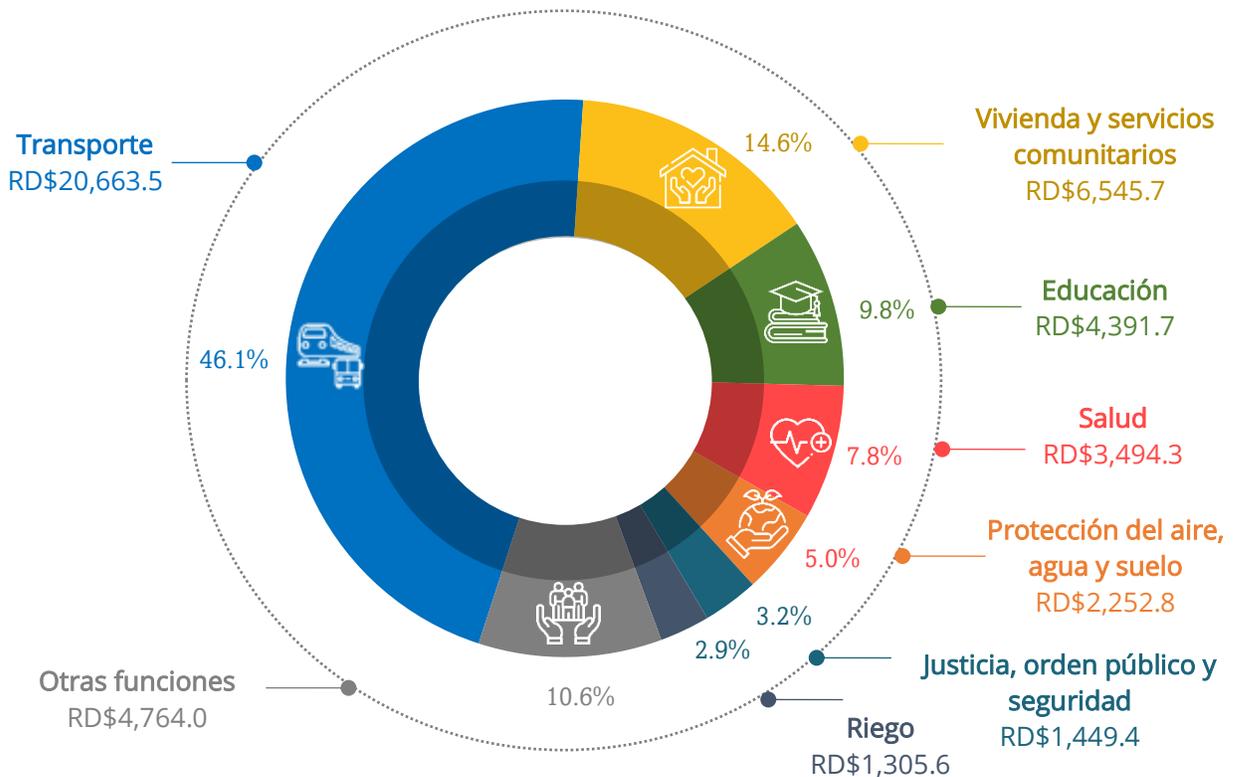

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MPEyD.

<sup>1</sup> Para más información ver anexo 1.



#### 4.4. Análisis según fuentes de financiamiento

Según las fuentes de financiamiento, la mayoría de los PIP ejecutados entre enero-junio del 2024 fueron financiados con el Fondo general por un monto de RD\$38,032.6 millones (84.8%). La segunda fuente más frecuente, resultó ser Crédito externo que financió RD\$6,717.9 millones (15%), seguido de las Donaciones que financiaron RD\$116.5 millones (0.3%).


Gráfico 16. Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por fuentes de financiamiento



Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

En cuanto a los RD\$6,717.9 millones de financiamiento con crédito externo, el 49.5% procedió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con RD\$3,324.8 millones, siendo este el organismo financiador con mayor inversión, seguido de un 24.1% del Banco Centroamericano de Integración Económica con RD\$1,616.3 millones y, en tercer lugar, un 12.5% de la Cooperación Andina de Fomento con RD\$838.2 millones.

Gráfico 17. Instituciones financiadoras del crédito externo (Millones RD\$)

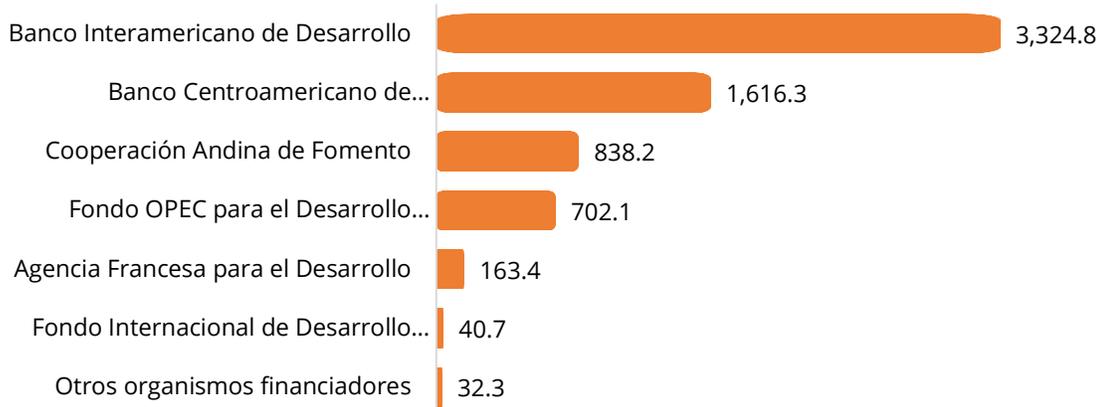

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

#### 4.5. Análisis según tipología del proyecto

Los proyectos de Capital fijo mostraron la mayor ejecución financiera por un monto de RD\$43,970.7 millones (98.0% respecto al total ejecutado), seguido de Capital humano con una inversión de RD\$782.9 millones, destinada principalmente al *Fortalecimiento institucional de la DGII para mejorar la eficacia en la administración tributaria y del control del gasto público*, y por último los proyectos de Creación de conocimiento por RD\$113.4 millones de los cuales más del 50% corresponde a la ejecución del *Levantamiento de la base cartográfica 1:5,000 y 1:25,000 de la República Dominicana*.



**Gráfico 18.** PIP por tipología y proporción de la ejecución, enero-junio 2024

**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

En las tres tipologías, la mayoría de los proyectos son de arrastre, en cumplimiento con el compromiso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de priorizar y dar continuidad y/o terminación a los proyectos ya iniciados. Para los proyectos de Capital fijo se ejecutó un monto de RD\$37,771.1 millones en proyectos de arrastre y unos RD\$6,199.6 millones en proyectos nuevos.

**Gráfico 19.** Proyectos de Inversión Pública programado anual vs. ejecutado por tipología y estado, enero-junio 2024 (Millones RD\$)




**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

#### 4.6. Análisis según sector institucional

El Gobierno central fue el subsector institucional que ejecutó la mayor parte de las inversiones, con un 82.1% de toda la ejecución, seguido de las Empresas públicas no financieras (14.0%) y las Instituciones públicas descentralizadas (3.7%).


**Gráfico 20.** Distribución porcentual del monto ejecutado en PIP por Subsector Institucional, enero-junio 2024

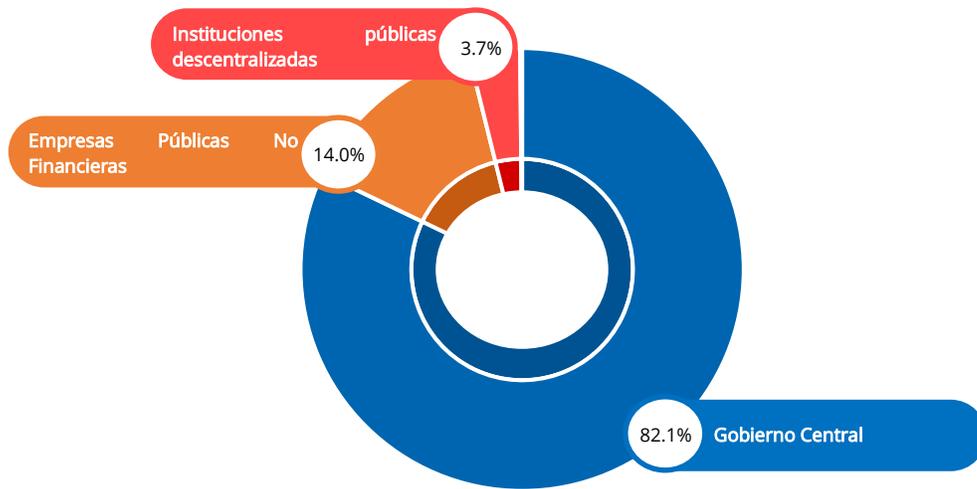

**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Las Empresas públicas no financieras tuvieron el mayor porcentaje de ejecución respecto a su programación (57.9%). Pero, el mayor monto ejecutado estuvo en manos del Gobierno central con RD\$36,850.5 millones.

**Gráfico 21.** PIP ejecutado por Subsector Institucional, enero-junio 2024 (Millones RD\$)

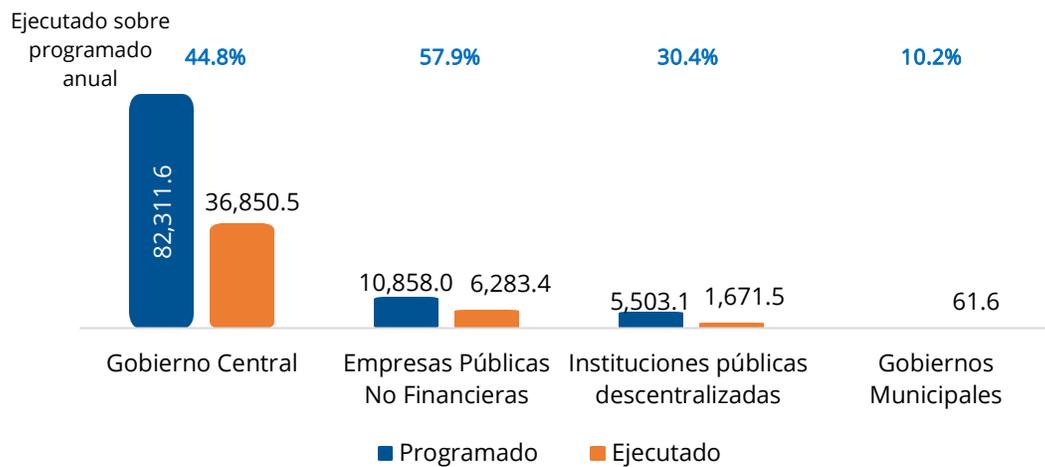


**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 5. Contribución de los Proyectos de Inversión Pública a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Los proyectos de inversión pública permiten la realización de actividades que contribuyen a la materialización de los objetivos y las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Al analizar la participación de proyectos vinculados a cada eje sobre el total ejecutado en el periodo, el eje con mayor representación es el tercero de Economía sostenible, integradora y competitiva con un 53.2%, seguido del segundo de Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades (36.5%), el cuarto de Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible que adapta al cambio climático con un 5.2% y, por último, el primero de Estado social democrático de derecho con un 5% de la ejecución total del periodo.


**Gráfico 22.** Distribución porcentual del monto ejecutado de los PIP por Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2024



**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

Los proyectos vinculados al primer eje fueron los que alcanzaron el mayor porcentaje de ejecución con respecto a lo programado para el año con un monto ejecutado de RD\$2,257.3 millones (62.8%). Le sigue el segundo eje con una ejecución de RD\$16,391.1 millones (50.4%), luego el tercer eje que efectuó una ejecución de RD\$23,888.7 millones, representado el 43.3% del monto programado para el año. Por último, el cuarto eje ejecutó un monto de RD\$2,330 millones, con un porcentaje de ejecución de 29.2%.

**Gráfico 23.** PIP por eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), enero-junio 2024 (Millones RD\$)

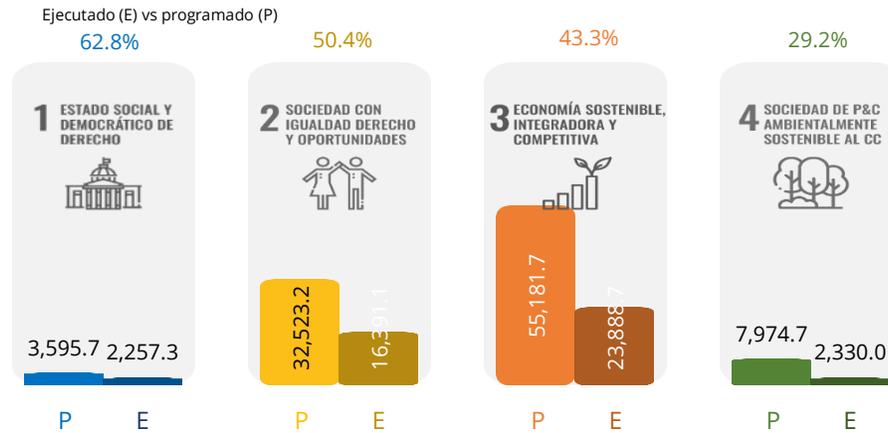

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MPEyD

## 6. Proyectos con mayor ejecución en el primer semestre 2024

A continuación se presentan los diez proyectos con la mayor ejecución de inversión pública para el primer semestre 2024 (ver Tabla 4):

1. El proyecto de inversión pública de mayor ejecución entre enero-junio 2024 fue la *Construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos-Luperón*; ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (OPRET) con un monto de RD\$3,068.3 millones. Dicho proyecto se encuentra próximo a terminar (con más de un 80% de avance).
2. La *Reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio Santo Domingo Norte* tuvo una ejecución de RD\$1,194.1 millones (74.2% del monto programado para el año). Este proyecto contempla la reconstrucción de vías de tránsito en sectores del municipio Santo Domingo Norte, con una incidencia sobre más de 3,329 personas que residen en la zona de influencia.
3. La *Construcción de paso a desnivel soterrado en la intersección de la Av. Luperón con Av. 27 de febrero* (rotonda Plaza de la Bandera) surge como respuesta al aumento de la congestión del tránsito vehicular en la intersección. Este proyecto requerirá de una inversión de RD\$2,575.8 millones y al cierre de junio mostró una ejecución de RD\$1,165.3 millones. Se espera que finalice para el 2026.
4. Desde el 2021, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones ha estado trabajando en el *Mejoramiento de 100,000 viviendas* a nivel nacional. Este proyecto busca mejorar o reconstruir viviendas (techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación), así como en algunos casos la construcción total de hogares con ingresos mínimos y en extrema pobreza. Entre enero-junio 2024 tuvo una ejecución acumulada de 1,059.8 millones, sobrepasando lo programado inicialmente.
5. La *Ampliación acueducto oriental barrera de salinidad y trasvase a Santo Domingo Norte, fase II* es un proyecto que tendrá impacto en el municipio de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte; en el primero se contempla la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en el

sistema Barrera para adicionar 2m<sup>3</sup>/seg. a la producción diaria y en el caso de Santo Domingo Norte, la construcción de tres depósitos reguladores de ocho millones de galones cada uno y la colocación de más de 52 km de redes para aumentar el abastecimiento de agua potable. La inversión total en este proyecto será de RD\$7,351.0 millones y entre enero-junio 2024 se ejecutó un 14% del monto total.

6. La *Construcción palacio de justicia de Santo Domingo Este* comprende la construcción de tres edificios destinados a las labores del Poder Judicial, Ministerio Público y Jurisdicción Inmobiliaria en Santo Domingo Este. Un proyecto de RD\$3,706.8 millones, en el cual se ejecutó un 28% del monto total.
7. El *Mejoramiento Puerto de Manzanillo y sus vías de conectividad* fue uno de los proyectos con mayor ejecución, con un monto de RD\$935.2 millones.
8. El proyecto de la *Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua*, entre enero-junio 2024 tuvo una ejecución de RD\$807.1 millones, destinados principalmente para la puesta en marcha y llenado de la presa, así como la continuidad de los trabajos de las compuertas hidromecánicas.
9. La *Construcción de infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo* en Pedernales surge como parte del plan para el desarrollo turístico de esta zona, dado que no existen vías organizadas, completas y en buen estado, por lo que es necesario crear vías nuevas, mejorar las existentes, así como la construcción de aceras y contenes. Este proyecto requerirá una inversión de RD\$2,732.3 millones y para el primer semestre 2024 tuvo una ejecución de RD\$977.6 millones (29% del monto total).
10. El proyecto *Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana* está enmarcado en el ámbito de las cuencas del río Yaque del Sur, Artibonito, Nizaito y el lago Enriquillo, en el cual se pretende recuperar los recursos naturales a través del desarrollo sostenible en las cuencas hidrográficas. La inversión total será de RD\$12,130.3 millones a manos de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal.

**Tabla 1.** Proyectos de Inversión Pública con mayor ejecución entre enero-junio 2024  
(Millones de RD\$)

| SNIP  | Nombre del proyecto  | Institución Ejecutora | Función   | Costo total       | Programado       | Ejecutado        | % Ejec. |
|-------|--|-----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------|
| 14558 | Construcción línea 2C del metro de Santo Domingo tramos: Alcarrizos- Luperón                         | OPRET                 | Transporte  | 31,005.5          | 8,657.8          | 3,068.3          | 35.4%   |
| 15312 | Reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio Santo Domingo Norte                   | MOPC                  | Transporte  | 2,773.6           | 1,609.9          | 1,194.1          | 74.2%   |
| 16365 | Construcción de paso a desnivel soterrado en la intersección de la Av. Luperón con Av. 27 de febrero | OPRET                 | Transporte  | 2,575.8           | 514.8            | 1,165.3          | 226.3%  |
| 14649 | Mejoramiento de 100,000 viviendas en la República Dominicana   | MIVED                 | Vivienda y servicios comunitarios                       | 8,983.2           | 727.9            | 1,059.8          | 145.6%  |
| 14534 | Ampliación acueducto oriental barrera de salinidad y trasvase a Santo Domingo Norte, fase II         | CAASD                 | Vivienda y servicios comunitarios                       | 7,351.0           | 2,314.9          | 1,027.8          | 44.4%   |
| 13637 | Construcción palacio de justicia de Santo Domingo Este   | MOPC                  | Justicia, Orden Público y Seguridad                     | 3,706.8           | 1,310.3*         | 1,026.5          | 78.3%   |
| 14546 | Mejoramiento Puerto de Manzanillo y sus vías de conectividad, Monte Cristi                           | MOPC                  | Transporte  | 6,019.0           | 1,446.0          | 935.2            | 64.7%   |
| 3731  | Construcción presa de Monte Grande, rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua     | INDRHI                | Riego   | 35,839.4          | 1,890.0          | 807.1            | 42.7%   |
| 16370 | Construcción de infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales           | MOPC                  | Transporte  | 2,732.3           | 977.6            | 782.1            | 80.0%   |
| 13928 | Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana             | UTEFDA                | Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos | 12,130.3          | 1,350.0          | 761.7            | 56.4%   |
|       |  |                       |   | <b>113,116.78</b> | <b>19,489.04</b> | <b>11,827.82</b> |         |

\*Se utilizó el dato del presupuesto vigente para el cálculo del porcentaje dado que no hubo una programación inicial.

**Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.

## 7. Anexos

**Anexo 1.** Proyectos de Inversión Pública según clasificación funcional, enero-junio 2024  
(millones RD\$)

| Funciones y subfunciones  | Programado      | Vigente         | Ejecutado       | Ejecutado/<br>programado | Ejecución %<br>del total |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.1.00 - Administración General</b>  | <b>2,213.2</b>  | <b>2,478.8</b>  | <b>756.8</b>    | <b>34.20%</b>            | <b>1.69%</b>             |
| 1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación        | 2,201.4         | 2,465.9         | 754.8           | 34.29%                   | 1.68%                    |
| 1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos  | 7.4             | 8.5             | 2.0             | 26.89%                   | 0.00%                    |
| 1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los gobiernos locales      | 4.4             | 4.4             | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>1.3.00 - Defensa Nacional</b>  | <b>2,462.6</b>  | <b>2,500.1</b>  | <b>152.8</b>    | <b>6.21%</b>             | <b>0.34%</b>             |
| 1.3.02 - Defensa civil y gestión de riesgo de desastre                                | 900.0           | 930.0           | 82.6            | 9.17%                    | 0.18%                    |
| 1.3.01 - Defensa militar  | 1,562.6         | 1,570.1         | 70.3            | 4.50%                    | 0.16%                    |
| <b>1.4.00 - Justicia, Orden Público y Seguridad</b>                                   | <b>506.7</b>    | <b>2,356.1</b>  | <b>1,449.4</b>  | <b>286.05%</b>           | <b>3.23%</b>             |
| 1.4.03 - Administración y Servicios de Justicia                                       | 56.9            | 1,500.0         | 1,152.7         | 2027.14%                 | 2.57%                    |
| 1.4.01 - Servicios de Seguridad Interior  | 306.2           | 419.4           | 210.5           | 68.76%                   | 0.47%                    |
| 1.4.04 - Prisiones  | 118.9           | 422.6           | 81.6            | 68.61%                   | 0.18%                    |
| 1.4.02 - Servicios de Protección Contra Incendios                                     | 19.7            | 12.7            | 4.6             | 23.40%                   | 0.01%                    |
| 1.4.05 - Servicios de Migraciones   | 5.0             | 1.4             | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>2.1.00 - Asuntos económicos, comerciales y laborales</b>                           | <b>16.2</b>     | <b>15.8</b>     | <b>0.0</b>      | <b>0.24%</b>             | <b>0.00%</b>             |
| 2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio                                 | 16.2            | 15.8            | 0.0             | 0.24%                    | 0.00%                    |
| <b>2.2.00 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura</b>                              | <b>942.6</b>    | <b>942.6</b>    | <b>97.5</b>     | <b>10.34%</b>            | <b>0.22%</b>             |
| 2.2.01 - Agropecuaria   | 731.5           | 731.5           | 97.5            | 13.32%                   | 0.22%                    |
| 2.2.04 - Conservación, ampliación y explotación racionalizada de reservas forestales. | 168.7           | 168.7           | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| 2.2.02 - Caza y pesca   | 42.4            | 42.4            | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>2.3.00 - Riego</b>   | <b>2,916.3</b>  | <b>4,135.9</b>  | <b>1,305.6</b>  | <b>44.77%</b>            | <b>2.91%</b>             |
| 2.3.01 - Riego  | 2,916.3         | 4,135.9         | 1,305.6         | 44.77%                   | 2.91%                    |
| <b>2.4.00 - Energía y combustible</b>   | <b>3,080.5</b>  | <b>3,081.6</b>  | <b>736.6</b>    | <b>23.91%</b>            | <b>1.64%</b>             |
| 2.4.04 - Energía eléctrica de fuentes termoeléctricas                                 | 2,451.0         | 2,451.0         | 726.1           | 29.63%                   | 1.62%                    |
| 2.4.01 - Energía eléctrica  | 27.0            | 28.2            | 10.5            | 38.75%                   | 0.02%                    |
| 2.4.05 - Energía eléctrica de fuentes hidroeléctricas                                 | 602.5           | 602.5           | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>2.5.00 - Minería, manufactura y construcción</b>                                   | <b>12.6</b>     | <b>78.8</b>     | <b>2.0</b>      | <b>15.71%</b>            | <b>0.00%</b>             |
| 2.5.02 - Manufacturas   | 12.6            | 14.6            | 2.0             | 15.71%                   | 0.00%                    |
| 2.5.01 - Extracción de recursos minerales   | 0.0             | 64.1            | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>2.6.00 - Transporte</b>  | <b>46,949.3</b> | <b>52,900.3</b> | <b>20,663.5</b> | <b>44.01%</b>            | <b>46.06%</b>            |
| 2.6.01 - Transporte por carretera   | 33,467.5        | 39,401.2        | 17,296.5        | 51.68%                   | 38.55%                   |
| 2.6.03 - Transporte por ferrocarril   | 13,024.7        | 13,024.7        | 3,284.4         | 25.22%                   | 7.32%                    |
| 2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte                          | 447.1           | 472.6           | 82.6            | 18.48%                   | 0.18%                    |
| 2.6.02 - Transporte por agua  | 10.0            | 1.7             | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>2.7.00 - Comunicaciones</b>  | <b>1,100.3</b>  | <b>1,100.3</b>  | <b>282.2</b>    | <b>25.65%</b>            | <b>0.63%</b>             |
| 2.7.01 - Comunicaciones   | 1,100.3         | 1,100.3         | 282.2           | 25.65%                   | 0.63%                    |

| Funciones y subfunciones  | Programado      | Vigente          | Ejecutado       | Ejecutado/<br>programado | Ejecución %<br>del total |
|---|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2.9.00 - Otros servicios económicos</b>  | <b>1,765.9</b>  | <b>2,727.4</b>   | <b>720.0</b>    | <b>40.77%</b>            | <b>1.60%</b>             |
| 2.9.03 - Turismo  | 1,727.8         | 2,658.6          | 692.8           | 40.10%                   | 1.54%                    |
| 2.9.01 - Comercio de distribución almacenamiento y deposito   | 38.1            | 63.8             | 27.2            | 71.32%                   | 0.06%                    |
| 2.9.02 - Hoteles y restaurantes   | 0.0             | 5.0              | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>3.1.00 - Protección del aire, agua y suelo</b>   | <b>4,085.8</b>  | <b>6,561.1</b>   | <b>2,252.8</b>  | <b>55.14%</b>            | <b>5.02%</b>             |
| 3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado   | 3,135.2         | 5,553.0          | 2,252.4         | 71.84%                   | 5.02%                    |
| 3.1.02 - Administración del agua  | 950.5           | 1,008.1          | 0.4             | 0.05%                    | 0.00%                    |
| <b>3.2.00 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos</b>   | <b>2,308.0</b>  | <b>2,217.8</b>   | <b>1,005.4</b>  | <b>43.56%</b>            | <b>2.24%</b>             |
| 3.2.01 - Protección de la biodiversidad y el paisaje  | 1,474.7         | 1,685.7          | 930.5           | 63.10%                   | 2.07%                    |
| 3.2.02 - Ordenación de desechos   | 833.3           | 532.1            | 74.9            | 8.99%                    | 0.17%                    |
| <b>4.1.00 - Vivienda y Servicios Comunitarios</b>   | <b>12,145.9</b> | <b>14,283.7</b>  | <b>6,545.7</b>  | <b>53.89%</b>            | <b>14.59%</b>            |
| 4.1.03 - Abastecimiento de agua potable   | 7,695.7         | 9,674.9          | 4,033.6         | 52.41%                   | 8.99%                    |
| 4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios  | 3,488.8         | 3,565.5          | 2,317.3         | 66.42%                   | 5.16%                    |
| 4.1.02 - Desarrollo comunitario   | 961.3           | 1,043.3          | 194.8           | 20.26%                   | 0.43%                    |
| <b>4.2.00 - Salud</b>   | <b>5,571.1</b>  | <b>4,844.6</b>   | <b>3,494.3</b>  | <b>62.72%</b>            | <b>7.79%</b>             |
| 4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud   | 3,051.4         | 2,316.5          | 1,636.4         | 53.63%                   | 3.65%                    |
| 4.2.02 - Servicios hospitalarios  | 1,454.1         | 1,468.2          | 1,098.0         | 75.51%                   | 2.45%                    |
| 4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud   | 1,065.5         | 1,007.2          | 733.6           | 68.85%                   | 1.64%                    |
| 4.2.04 - Servicio Social para la Atención de la Salud   | 0.0             | 52.7             | 26.4            | 50.00%                   | 0.06%                    |
| <b>4.3.00 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas</b>                                      | <b>1,479.3</b>  | <b>2,504.3</b>   | <b>856.5</b>    | <b>57.90%</b>            | <b>1.91%</b>             |
| 4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos   | 1,099.2         | 1,849.3          | 576.8           | 52.48%                   | 1.29%                    |
| 4.3.03 - Servicios culturales   | 228.9           | 369.3            | 205.1           | 89.60%                   | 0.46%                    |
| 4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios religiosos   | 150.6           | 264.9            | 64.7            | 42.97%                   | 0.14%                    |
| 4.3.99 - Planificación, gestión y supervisión de las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas | 0.0             | 20.0             | 10.0            | 49.66%                   | 0.02%                    |
| 4.3.04 - Servicios de radio, televisión y servicios editoriales   | 0.7             | 0.7              | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>4.4.00 - Educación</b>   | <b>10,530.7</b> | <b>11,681.4</b>  | <b>4,391.7</b>  | <b>41.70%</b>            | <b>9.79%</b>             |
| 4.4.02 - Educación básica   | 2,869.6         | 4,147.4          | 2,229.1         | 77.68%                   | 4.97%                    |
| 4.4.04 - Educación superior   | 1,099.8         | 1,181.1          | 1,152.1         | 104.76%                  | 2.57%                    |
| 4.4.01 - Educación inicial  | 6,556.2         | 5,952.0          | 971.1           | 14.81%                   | 2.16%                    |
| 4.4.06 - Educación técnica  | 5.1             | 378.3            | 20.8            | 409.48%                  | 0.05%                    |
| 4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionados con la educación   | 0.0             | 15.4             | 11.7            | 76.08%                   | 0.03%                    |
| 4.4.05 - Educación de adultos   | 0.0             | 5.5              | 5.5             | 100.00%                  | 0.01%                    |
| 4.4.03 - Educación media  | 0.0             | 1.7              | 1.4             | 80.00%                   | 0.00%                    |
| <b>4.5.00 - Protección social</b>   | <b>1,188.3</b>  | <b>2,331.3</b>   | <b>154.1</b>    | <b>12.97%</b>            | <b>0.34%</b>             |
| 4.5.09 - Juventud   | 238.9           | 719.9            | 91.3            | 38.22%                   | 0.20%                    |
| 4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección social   | 665.4           | 665.4            | 61.6            | 9.26%                    | 0.14%                    |
| 4.5.08 - Equidad de genero  | 3.8             | 3.8              | 1.2             | 30.95%                   | 0.00%                    |
| 4.5.05 - Familia e hijos  | 23.9            | 37.2             | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| 4.5.01 - Edad avanzada, pensiones (por edad o incapacidad)  | 5.5             | 5.5              | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| 4.5.06 - Desempleo  | 250.7           | 899.4            | 0.0             | 0.00%                    | 0.00%                    |
| <b>Total general</b>  | <b>99,275.2</b> | <b>116,741.7</b> | <b>44,867.0</b> | <b>45.19%</b>            | <b>100.00%</b>           |

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública, MEPyD.
